

INFORME DE PROGRESO DE LA **AGENDA 2030 DEL** **MUNICIPIO DE** **TACORONTE**

ÍNDICE

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y PUNTO DE PARTIDA	2
2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE PROYECTOS.	5
3. ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL 2025	7
4. SIGUIENTES PASOS.	26

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y PUNTO DE PARTIDA

1.1. La Agenda 2030 del Municipio de Tacoronte.

El municipio de Tacoronte, alineado con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 pero atendiendo a su vez a sus características y necesidades detectadas en el diagnóstico previo llevado a cabo, identificó los retos que serían abordados en el periodo 2025-2030 desde las prioridades de actuación y los 118 proyectos planificados.

Dimensión Personas

Reto municipal 01. Reducir las desigualdades, la pobreza y mejorar la salud pública	
PA01.1. Acceso a las necesidades básicas	PA01.2. Atención socio-sanitaria
PA01.3. Fomento de hábitos saludables	PA01.4. Creación de empleo
PA01.5. Garantizar el acceso a la vivienda asequible y de alta calidad para la población	

Reto municipal 02. Reforzar la comunidad, la participación y la educación	
PA02.1. Formación a lo largo de la vida	PA02.2. Fomento de la solidaridad, la participación ciudadana y el voluntariado
PA02.3. Inclusión y atención a la diversidad	

Reto municipal 03. Lograr la igualdad de género y prevenir la violencia contra las mujeres	
PA03.1. Igualdad de género	PA03.2. Prevención de violencia de género

Dimensión Planeta

Reto municipal 04. Conservar el medio ambiente	
PA04.1. Gestión integral de los recursos hídricos	PA04.2. Suministro de energía limpia, asequible y segura
PA04.3. Economía circular	PA04.4. Protección de la biodiversidad

Dimensión Prosperidad

Reto municipal 05. Dinamizar la economía y el tejido empresarial local	
PA05.1. Revalorización del sector primario	PA05.2. Fortalecimiento del tejido empresarial local

PA05.3. Turismo sostenible	PA05.4. Atracción y retención del talento
PA05.5. Innovación y transformación digital	

Dimensión Gobernanza pública

Reto municipal 06. Mejorar las infraestructuras	
PA06.1. Modernizar y mantener infraestructuras públicas clave	PA06.2. Priorizar la sostenibilidad del municipio en la toma de decisiones

Reto municipal 07. Afrontar los retos territoriales, la movilidad y la conectividad	
PA07.1. Mejorar la conectividad y accesibilidad entre las periféricas y el centro urbano	PA07.2. Promover soluciones de movilidad sostenibles
PA07.3. Gestión integral del territorio	

Reto municipal 08. Alcanzar una gestión pública eficiente y transparente	
PA08.1. Mejora de la eficacia de la administración municipal	PA08.2. Fomentar un gobierno abierto y la transparencia en la gestión pública
PA08.3. Contratación pública socialmente responsable	PA08.4. Potenciar la formación continua del personal municipal
PA08.5. Comunicación y difusión pública de los proyectos municipales	PA08.6. Lucha contra la corrupción

Dimensión Patrimonio cultural y cultura

Reto municipal 09. Valorar y promocionar la cultura local	
PA09.1. Difusión y puesta en valor de la historia y el patrimonio cultural del municipio	PA09.2. Conservación de tradiciones del municipio y sus barrios
PA09.3. Desarrollo de una oferta cultural diversa, inclusiva y accesible	

1.2. Equipo ODS y servicio de acompañamiento y asesoramiento.

En el marco de la Agenda 2030 del municipio de Tacoronte, se ha procedido a la contratación de 15 profesionales de diferentes sectores, quienes han trabajado en la revisión y seguimiento de los diferentes proyectos previstos en la agenda municipal. Concretamente se ha contado con los siguientes perfiles profesionales:

- 2 Promotoras de igualdad
- 1 Dinamizadora turística
- 1 Ingeniero industrial
- 1 Economista
- 2 Educadoras ambientales
- 3 Dinamizadoras comunitarias
- 2 Electricistas (ambos sustituidos por dos nuevas personas)
- 1 Coordinadora del proyecto (sustituida por un nuevo coordinador)
- 1 Diseñadora gráfica
- 1 Auxiliar administrativa

Para llevar a cabo el seguimiento, dicho equipo de trabajo ha creado fichas de trabajo por cada proyecto y se han solicitado diversas reuniones con las áreas responsables de su ejecución para ir dando a conocer dichos proyectos, que se pudiesen incluir en la planificación anual y se realizase un seguimiento y medición de las actuaciones realizadas y sus resultados.

Complementariamente a este equipo se ha contratado a A Bote Pronto para la realización de un servicio de acompañamiento y asesoramiento cuyo objetivo principal ha sido el impulso de la Agenda 2030 del municipio de Tacoronte en su primer año. Dado el conocimiento práctico de dicha empresa, ésta ha sido la encargada de formar al equipo ODS durante todo su periodo de contratación para que se pudiese recopilar y estructurar la información de cada uno de los proyectos previstos en la Agenda 2030 de Tacoronte.

Para ello, se han llevado a cabo diversas reuniones presenciales en las que se han planteado objetivos y se ha ido analizando la situación del grado de ejecución de la Agenda. Asimismo, dichas reuniones han servido para analizar los obstáculos encontrados por parte del equipo a la hora de obtener la información de los proyectos y plantear vías alternativas para conseguir la información.


Por otra parte, las sesiones presenciales se han reforzado con reuniones individualizadas celebradas mediante videoconferencia en las que se ha visto con detalle la situación de cada uno de los 118 proyectos, asesorando sobre el enfoque a aplicar a la hora de cumplimentar las fichas y la información pendiente de solicitar.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE PROYECTOS.

A continuación, se presenta la planificación temporal establecida para cada proyecto, es decir, el año o los años en los que está prevista su ejecución por cada área municipal. Adicionalmente a ello, cada año se revisarán los proyectos ejecutados y sus resultados, valorando nuevamente la posibilidad de modificar los plazos previstos y por tanto, actualizando dicha planificación:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sin fecha definida	Sin ejecución prevista	Total
A01. Alcaldía y cultura	7	2	0	0	0	0	0	0	9
A02. Fiestas, movilidad, transporte, participación ciudadana y asociaciones de vecinos	3	3	0	0	0	0	5	0	11
A03. Servicios sociales- obras y servicios - personal de oficio	11	1	0	0	0	0	2	0	14
A04. Urbanismo, accesibilidad, patrimonio, costas, innovación y nuevas tecnologías	5	4	2	0	0	0	0	0	11
A05. Hacienda, contratación, empleo y desarrollo local, voluntariado y residuos sólidos	17	4	3	0	0	0	1	0	25
A06. Juventud y Deportes	1	0	0	0	0	0	2	0	3
A07. Recursos humanos, educación y OMIC	6	0	0	0	0	0	2	1	9
A08. Seguridad ciudadana, policía local, prensa y comunicación, asociación de mayores e igualdad	5	0	0	0	0	0	1	1	7
A09. Comercio, sanidad y salud, bienestar animal y cementerio	7	0	0	0	0	0	2	0	9
A10. Turismo y protección civil	3	1	0	0	0	0	0	0	4
A11. Transición ecológica, sector primario, parques y jardines, medio ambiente y montes	9	1	1	0	0	0	0	0	11
A12. Alumbrado público, aguas y saneamiento, apoyo familiar y prevención de las adicciones y talleres municipales	1	3	0	0	0	0	1	0	5
Total	75								

Si analizamos la distribución de los 118 proyectos de la Agenda 2030 de Tacoronte por retos municipales, encontramos que el mayor porcentaje de proyectos se concentran en el **Reto municipal 2: Reforzar la comunidad, la participación y la educación**, seguido del **Reto municipal 01. Reducir las desigualdades, la pobreza y mejorar la salud pública**.

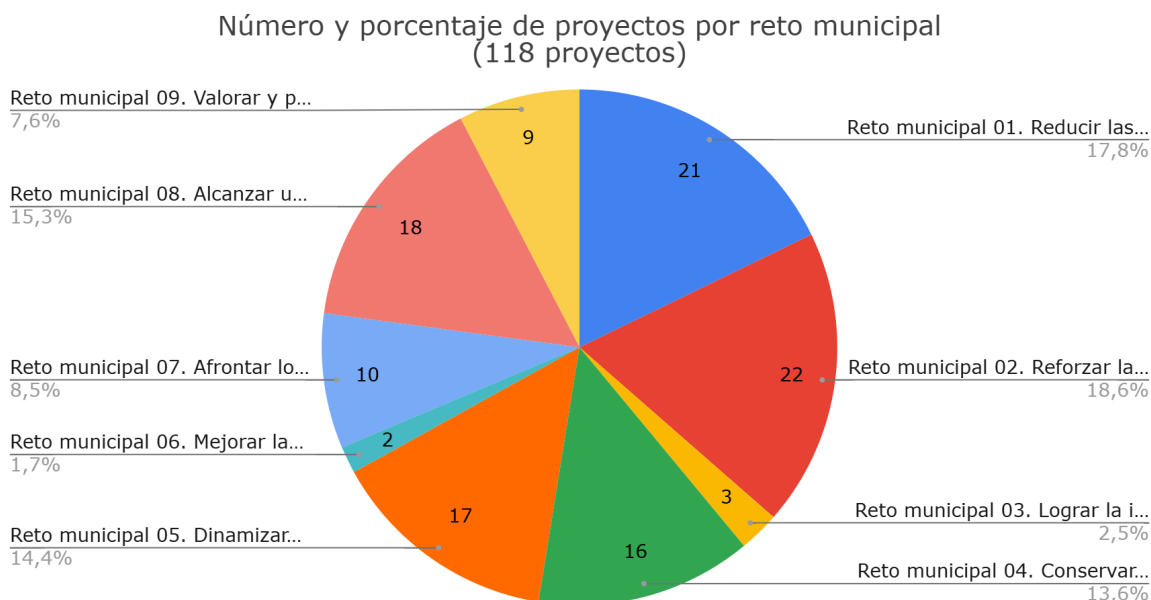


Éstos se distribuyen entre las áreas municipales siendo el área de A05. Hacienda, contratación, empleo y desarrollo local, voluntariado y residuos sólidos la que mayor número de proyectos tiene asignados (25 proyectos) seguida del área A03. Servicios sociales- obras y servicios - personal de oficio (14 proyectos).



3. ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL 2025

A continuación, se presentan los proyectos planificados para iniciar su ejecución en el año 2025 diferenciados por áreas municipales e indicando el estado actual. El estado se presenta con un sistema de semáforo siguiendo el código de colores:

- **Gris.** Sin información disponible pese a estar planificado para el año 2025.
- **Rojo.** No ejecutado pese a estar planificado para el año 2025.
- **Amarillo.** En proceso de ejecución, aunque resulta necesario continuar trabajando en ello.
- **Verde.** Buen avance en la ejecución del proyecto (total o parcialmente) aunque el proyecto esté previsto para ejecutar en varios años.

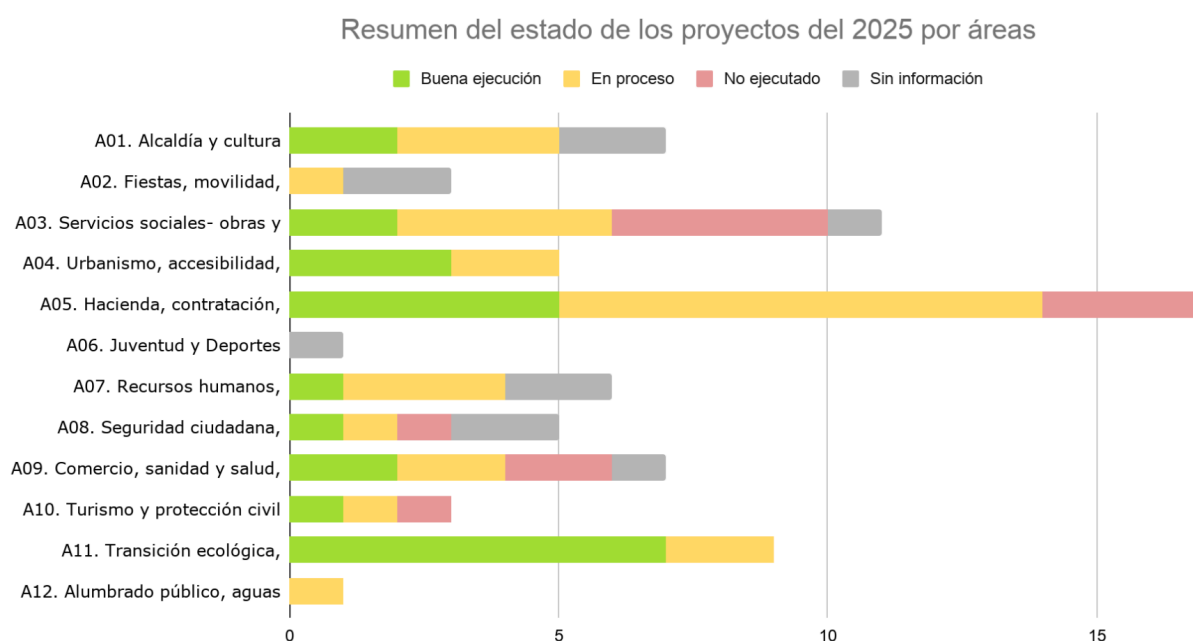

A01. Alcaldía y cultura

Proyecto	Estado	Situación
P76. Fomento del talento local a través de la inclusión de artistas en los espacios culturales del municipio.		- Se han realizado avances en la difusión y visibilización del talento local, siendo necesario continuar avanzando en dicha línea de trabajo. - No se han definido indicadores. - El presupuesto asignado es para el área de cultura pero no específicamente para el proyecto. - Se recomienda ampliar el plazo de ejecución planteado.
P93. Implementación de un sistema protocolizado de reuniones periódicas entre representantes de cada área municipal.		- Acciones acordes a la descripción del proyecto. - No se dispone de indicadores. - El presupuesto asignado es del área de cultura.
P110: Campaña para fortalecer la identidad local y el sentido de pertenencia en Tacoronte, involucrando a partidos políticos, asociaciones y ciudadanía.		- Se han realizado avances en la difusión de las tradiciones del municipio aunque se considera necesario continuar trabajando en ello - No se han definido indicadores. - El presupuesto asignado es para el área de cultura pero no específicamente para el proyecto. - Dadas las características del proyecto se recomienda ampliar el plazo de ejecución planteado.

P113: Apostar por la difusión del patrimonio y de la historia tacorontera.		- Se han realizado avances en la difusión del patrimonio e historia del municipio aunque se considera necesario continuar trabajando en ello. - No se han definido indicadores. - El presupuesto asignado es para el área de cultura pero no específicamente para el proyecto. - Dadas las características del proyecto se recomienda ampliar el plazo de ejecución planteado.
P116. Agenda cultural permanente, accesible e inclusiva para todo el municipio.		No se dispone de información
P117. Festival cultural itinerante para la participación y cohesión de los barrios del municipio.		No se dispone de información
P118. Acondicionamiento de espacios municipales para la promoción la cultura		- Acciones acordes a la descripción del proyecto. - Indicadores identificados - Presupuesto asignado.

A02. Fiestas, movilidad, transporte, participación ciudadana y asociaciones de vecinos

Proyecto	Estado	Situación
P38. Desarrollo de programas y proyectos de atención a la población LGTBIQ+		- Se realiza la adhesión a la Red Asterisco y se comienza a trabajar en algunas acciones pero queda pendiente el desarrollo de programas y proyectos dirigidos específicamente a la población LGTBIQA+. - Existe margen de mejora en la identificación de indicadores. - No existe presupuesto asignado. - Se recomienda ampliar el plazo de ejecución planteado.
P114. Programa municipal de eventos sostenibles conforme a la norma ISO 20121.		No se dispone de información
P115. Programa de conservación y promoción de las fiestas populares de Tacoronte		No se dispone de información

A03. Servicios sociales- obras y servicios - personal de oficio

Proyecto	Estado	Situación
P01. Programa de ayudas de emergencia.		- El plazo de ejecución planteado es 2025 pero se recomienda extenderlo y que sea un proyecto anual. - El presupuesto asignado hace referencia al presupuesto del área de servicios sociales pero no al del proyecto.
P02. Programa municipal de apoyo a familias vulnerables		No se dispone de información
P03. Desarrollo de infraestructuras que permitan el desarrollo de servicios sociales proactivos que fomenten la autonomía		- Está previsto finalizar el proyecto en el año 2026. - No se ha establecido presupuesto.
P04. Política socio-sanitaria integral.		No se dispone de información
P.05. Programa de atención a la dependencia		Información disponible insuficiente
P06. Programa "Tacoronte Mayor Activo"		- El plazo de ejecución planteado es 2025 pero se recomienda extenderlo ya que hay acciones que no han sido abordadas como el censo para cuantificar la situación de soledad no deseada en el municipio. - No se ha abordado hasta el momento el acceso a la tecnología por parte de las personas mayores del municipio. - El presupuesto asignado hace referencia al presupuesto del área de servicios sociales pero no al del proyecto. - No se dispone de indicadores que permitan medir el

		impacto de las acciones desarrolladas en 2025.
P18: <u>Iniciativas de alquiler asequible</u>		- Las acciones desarrolladas encajan con el proyecto. - No se dispone de indicadores. - El presupuesto asignado es del área de servicios sociales pero no específico del proyecto.
P19: <u>Puesta a disposición de las viviendas de emergencia social para personas o familias que lo requieran.</u>		- Las acciones desarrolladas encajan con el proyecto. - Se dispone de indicadores. - El presupuesto asignado es del área de servicios sociales pero no específico del proyecto.
P21: <u>Programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas.</u>		- Las acciones desarrolladas encajan con el proyecto. - Se dispone de indicadores. - El presupuesto asignado es específico del proyecto. - Dado que se plantea un plazo de ejecución recurrente, deberá abordarse los siguientes años.
P39: <u>Programa de inclusión social para colectivos vulnerables.</u>		- Se ha realizado una jornada de reflexión pero no se ha trabajado en la creación de programas de apoyo a colectivos vulnerables mediante la dotación de recursos y asistencia. - No existen indicadores. - No existe presupuesto. - Se recomienda ampliar el plazo de ejecución planteado.
P40: <u>Diagnóstico y programas de apoyo a personas con discapacidad en Tacoronte</u>		- Se lleva a cabo el censo pero se descarta la ejecución del diagnóstico. - Hasta el momento no se han desarrollado programas de apoyo para las personas con discapacidad del municipio ni acciones para favorecer su inclusión. - No se dispone de indicadores. - El presupuesto asignado es del área de servicios sociales pero no específico del proyecto.

A04. Urbanismo, accesibilidad, patrimonio, costas, innovación y nuevas tecnologías

Proyecto	Estado	Situación
P80: Plan de mantenimiento integral de infraestructuras públicas.		- Conforme a la información facilitada en la ficha se han llevado a cabo acciones vinculadas al proyecto pero la descripción está orientada únicamente a la reducción del consumo eléctrico de edificios municipales, lo cual no está relacionado con el proyecto. - No se dispone de indicadores pues los actuales no guardan relación con el proyecto. - Presupuesto asignado
P88: Intervenciones en el litoral del Prís y Mesa del Mar		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Indicadores no definidos. - Presupuesto no definido.
P90: Plan de mejora y embellecimiento de todos los barrios del municipio (incluido en PACES).		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Indicadores definidos. - Presupuesto definido.
P91: Adquisiciones de propiedades privadas por su interés estratégico en el municipio.		- Buen avance en la ejecución del proyecto aunque aún queda pendiente la adquisición de varias propiedades contempladas en la descripción. - Se recomienda por tanto ampliar el plazo de ejecución. - Indicadores no definidos - Presupuesto no definido.
P94: Transformación digital de la administración municipal para una gestión más ágil y cercana.		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Indicadores definidos aunque se recomienda su revisión para su mejora. - Presupuesto definido.

A05. Hacienda, contratación, empleo y desarrollo local, voluntariado y residuos sólidos

Proyecto	Estado	Situación
P16: Desarrollo de Programas de Empleo Municipales		- Gran avance en la ejecución del proyecto. - Indicadores claramente definidos. - Dado el plazo de ejecución planteado, deberá abordarse los siguientes años.
P23: Formación y recualificación de la población activa.		- Las acciones formativas realizadas permiten la recualificación de la población activa pero existe margen de mejora en el abordaje de formación vinculada a las nuevas tecnologías y los sectores emergentes. - Indicadores claramente definidos. - Se recomienda ampliar el plazo de ejecución planteado.
P24: Plataforma de formación online para el empleo.		- Las acciones formativas ofertadas no son online pese a que el formulario de inscripción sí lo sea. El ayuntamiento no dispone actualmente de la plataforma de formación online contemplada en el proyecto. - Se recomienda ampliar el plazo de ejecución planteado.
P31: Ejecución de las acciones recogidas en los 4 ejes de la estrategia municipal de voluntariado 2024		- Las acciones se han centrado principalmente en el Eje 2 de la estrategia municipal de voluntariado "sensibilización y formación" siendo necesario que se continúe avanzando en el abordaje de los otros ejes.. - No se han definido indicadores. - No se ha establecido presupuesto.
P36: Proyecto de trabajo colaborativo para el abordaje de la Agenda 2030 en el municipio		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Indicadores definidos. - Presupuesto definido. - Dado el plazo de ejecución planteado, deberá abordarse los siguientes años.
P55: Desarrollo de minipuntos limpios itinerantes que se desplazarán por el municipio.		- Aunque el proyecto estaba previsto para iniciarlo en el 2025, no ha sido posible concluir la adquisición del equipamiento. - Se deben revisar los indicadores ya que se han incluido a pesar de no haber ejecutado el proyecto.

P74: <u>Programa de itinerarios personalizados para el desarrollo de competencias.</u>		- Se han realizado acciones formativas alineadas con la descripción del proyecto. - Indicadores claramente definidos aunque se recomienda su revisión ya que se centran en el itinerario de hostelería. Valorar la posibilidad de retomar los indicadores planteados en la Agenda 2030 de Tacoronte. - Presupuesto definido.
P77: <u>Programa de formación para el empleo en competencias clave, digitalización y sostenibilidad</u>		- Se han realizado avances en la oferta de formación pero se considera necesario continuar avanzando en esa línea de trabajo para incluir formación que no solo vaya dirigida a personas desempleadas y que incluya el desarrollo de habilidades digitales. - Se recomienda seguir trabajando en la definición de indicadores que respondan con mayor detalle al objetivo del proyecto. - Presupuesto asignado.
P81. <u>Red de entidades locales para la agenda 2030 de la FEMP</u>		- La información facilitada en la ficha del proyecto se centra en la adhesión del municipio a la Red mientras que la descripción del proyecto plantea el fortalecimiento y participación activa en dicha red. Debido a ello, se recomienda ampliar el plazo de ejecución.
P92: <u>Optimización de la estructura de personal municipal para una gestión pública más eficiente.</u>		- Se ha producido un traspaso de responsabilidades de este proyecto, siendo en el 2026 asumido por el área de Hacienda, contratación, empleo y desarrollo local, voluntariado y residuos sólidos. - Gran avance en la ejecución del proyecto. - Indicadores definidos. - Presupuesto no definido pero sí justificado.
P96. <u>Realizar una evaluación del impacto de las subvenciones y las licitaciones concedidas</u>		- Las acciones desarrolladas no guardan relación directa con la descripción del proyecto. - Se recomienda revisar el indicador dado que la acción desarrollada no está directamente relacionada con el proyecto. - Sin presupuesto asignado.
P97. <u>Revisión de ordenanzas fiscales para una política tributaria integral orientada al</u>		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Indicadores definidos aunque incompletos. - Presupuesto no definido pero sí justificado.

<u>desarrollo sostenible</u>		
P98. <u>Implantación de sistemas de gestión alineados con estándares de calidad y sostenibilidad.</u>		- Se ha avanzado en la ejecución del proyecto aunque la certificación ISO 9001 es exclusivamente para el área de Hacienda, contratación, empleo y desarrollo local, voluntariado y residuos sólidos. Queda pendiente la certificación en todo el ayuntamiento y la implantación de la ISO 14001. - No existe presupuesto asignado. - Indicador definido.
P100. <u>Adhesión a Redes de innovación.</u>		- Se ha avanzado en la ejecución del proyecto aunque el enfoque del trabajo se ha centrado en la ciudadanía mientras que el proyecto estaba originalmente dirigido a la administración municipal. Se recomienda revisar el enfoque del proyecto y valorar su posible adaptación. - No existe presupuesto asignado. - Indicador definido.
P103: <u>Ciclo de jornadas sobre innovación pública y gobierno abierto para una gestión más transparente y participativa.</u>		- Se ha avanzado en la ejecución del proyecto aunque se recomienda seguir trabajando en ello desarrollando no solo acciones dirigidas a la ciudadanía sino también acciones dirigidas a representantes públicos y personal técnico del ayuntamiento. - Presupuesto asignado. - No se han identificado indicadores. - Se recomienda ampliar el periodo de ejecución.
P104. <u>Plataforma digital de comunicación y participación ciudadana</u>		- Se ha producido un traspaso de responsabilidades de este proyecto, siendo en el 2026 asumido por el área de Hacienda, contratación, empleo y desarrollo local, voluntariado y residuos sólidos. - Se ha avanzado en la ejecución del proyecto aunque debido al cambio realizado, aún se puede continuar avanzando en nuevas actuaciones. - No existe presupuesto asignado, aunque sí justificado. - Indicadores definidos.

106. <u>Políticas de contratación responsable que favorezcan a colectivos vulnerables activando contratos reservados y la inclusión de cláusulas sociales (Decreto 956/2024 de la Alcaldía)</u>		- Se ha avanzado en la ejecución del proyecto aunque queda pendiente poder seguir trabajando en la incorporación de criterios de sostenibilidad (gobernanza, social y ambiental) en los procesos de contratación y licitaciones. - No existe presupuesto asignado, aunque sí justificado. - Indicadores definidos aunque se recomienda su revisión para confirmar que son correctos.
--	--	--

A06. Juventud y Deportes

Proyecto	Estado	Situación
P28: Proyecto Tacoronte Activo 2030 para la población juvenil		- No se dispone de información

A07. Recursos humanos, educación y OMIC

Proyecto	Estado	Situación
P11 Fomentar el programa Ecocomedores en centros educativos y residencias del Municipio.		- Se ha trabajado el proyecto con los colegios pero queda pendiente implementar el programa en las residencias del municipio. - No existe presupuesto asignado.
P22. Proyecto de educación para la sostenibilidad.		- Se ha trabajado el proyecto aunque se considera necesario continuar avanzando en las iniciativas educativas desde una visión global dirigida a toda la población. - Se recomienda revisar el presupuesto asignado. - Se recomienda revisar los indicadores identificados.
P25 Programas de competencias STEM		- Las acciones desarrolladas encajan con el proyecto. - No se dispone de indicadores. - El presupuesto asignado es específico del proyecto.
P27: Talleres de alfabetización dirigidos a toda la población		No se dispone de información
P29: Desarrollo de programas formativos de educación en valores para la ciudadanía.		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Indicadores bien definidos. - Dado el plazo de ejecución planteado, deberá abordarse los siguientes años. - El presupuesto indicado corresponde únicamente a una de las acciones por lo que se recomienda su revisión y adaptación.
P107. Capacitación y formación interna del personal municipal orientada a mejorar sus competencias.		No se dispone de información

A08. Seguridad ciudadana, policía local, prensa y comunicación, asociación de mayores e igualdad

Proyecto	Estado	Situación
P44. Desarrollo de las medidas y actividades recogidas en los ejes de actuación del Plan de Igualdad Municipal.		- No se han ejecutado acciones y las acciones previstas se centran exclusivamente en la formación. - No existen indicadores.
P45. Impulsar la Red de municipios por la igualdad de género del norte de Tenerife.		No se dispone de información
P46. Programa Tacoronte Libre de Violencia de Género.		- Se han realizado algunas acciones pero no se ha abordado el proyecto “educación afectivo-sexual” ni se ha fortalecido la atención a las víctimas de violencia de género. - No existen indicadores. - No existe presupuesto.
P86. Mejora de infraestructuras y recursos para fortalecer la seguridad ciudadana en el municipio.		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Indicadores bien definidos. - Presupuesto definido. - Dado el plazo de ejecución planteado, deberá abordarse los siguientes años.
P108: Desarrollo de una marca municipal única que implique variantes en función del tipo de proyectos que se quieren desarrollar		No se dispone de información

A09. Comercio, sanidad y salud, bienestar animal y cementerio

Proyecto	Estado	Situación
P12: Programa de alimentación saludable “Tacoronte Saludable”.		- Se han realizado acciones sobre hábitos de salud y desperdicio alimentario pero no se ha trabajado hasta el momento en la concienciación sobre alimentación saludable, recetas saludables, lectura de etiquetado de productos, así como la promoción de la gastronomía local. - No existen indicadores sobre las acciones realizadas. - No existe presupuesto.
P13: Promoción de actividades en días internacionales relacionados con la salud.		- Se han realizado acciones sobre hábitos de salud y deporte pero no se han abordado acciones vinculadas a los días internacionales como la diabetes, etc tal y como recoge el proyecto. - No existen indicadores sobre las acciones realizadas. - No existe presupuesto.
P14: Servicio psicológico municipal en el que se incorporen actividades grupales que favorezcan la salud mental		- Se han realizado acciones centradas en la sensibilización y prevención de problemas de salud mental pero no se han abordado la implementación del servicio psicológico para quienes ya tienen esos problemas psicológicos. - No existen indicadores sobre las acciones realizadas. - Se recomienda ampliar el plazo de ejecución - El presupuesto planteado es para la protección de la salubridad pública por lo que no es específico para este proyecto.
P58. Acciones de colaboración con plataformas y asociaciones de protección animal que complementen la política municipal.		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Indicadores bien definidos. - Presupuesto definido. - Dado el plazo de ejecución planteado, deberá abordarse los siguientes años.
P61: Concienciación acerca del bienestar		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Indicadores sin definir.

animal.		- Presupuesto sin definir. - Dado el plazo de ejecución planteado, deberá abordarse los siguientes años.
P62. Gestión de colonias felinas.		No se dispone de información
P101: Plan de Bienestar animal.		- Se han realizado acciones pero hasta el momento no se ha trabajado en la elaboración del plan de bienestar animal. - No existen indicadores sobre las acciones realizadas. - Presupuesto asignado.

A10. Turismo y protección civil

Proyecto	Estado	Situación
P72: Promoción del producto local y desarrollo de experiencias enogastronómicas sostenibles en Tacoronte.		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Sin definir indicadores. - Presupuesto definido - Se recomienda valorar la posibilidad de ampliar el plazo de ejecución planteado.
P73: Turismo sostenible basado en la naturaleza y la cultura local.		- Se han realizado acciones pero no guardan relación directa con el turismo y el patrimonio natural y cultural del municipio. - No existen indicadores sobre las acciones realizadas. - Presupuesto asignado. - Se recomienda ampliar el plazo de ejecución
P111: Desarrollo del Programa “Tacoronte Histórico”.		- Se han realizado acciones vinculadas al proyecto siendo necesario continuar trabajando en esta línea. Se recomienda eliminar de la ficha las actuaciones vinculadas a los productos locales y consumo responsable dado que este proyecto se centra en el valor patrimonial y la cultura del municipio. - No existen indicadores sobre las acciones realizadas. - Presupuesto asignado.

A11. Transición ecológica, sector primario, parques y jardines, medio ambiente y montes.

Proyecto	Estado	Situación
P51. Campaña de sensibilización sobre energías limpias.		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Indicadores bien definidos. - Presupuesto definido. - Dado el plazo de ejecución planteado, deberá abordarse los siguientes años.
P52. Ejecución y seguimiento del Plan de acción para el clima y la energía sostenible (PACES) de Tacoronte.		- Se han desarrollado acciones alineadas con el proyecto. - No existen indicadores que permitan medir el impacto de las acciones que se están desarrollando. - Dado el plazo de ejecución planteado, deberá abordarse los siguientes años.
P53. Fomento del uso de energías renovables en edificios públicos (incluido en PACES).		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Indicadores bien definidos. - Presupuesto definido. - Dado el plazo de ejecución planteado, deberá abordarse los siguientes años.
P56. Impulso de proyectos de reciclaje comunitario (incluido en PACES).		- Se han desarrollado acciones alineadas con el proyecto. - Indicadores bien definidos. - Presupuesto definido. - Se recomienda ampliar el plazo de ejecución
P57: Plan de impulso para la limpieza de terrenos en desuso.		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Sin definir indicadores. - Presupuesto sin definir. - Dado el plazo de ejecución planteado, deberá abordarse los siguientes años.
P60. Proyecto de conservación de zonas		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Sin definir indicadores. - Presupuesto definido - Dado el plazo de ejecución planteado, deberá

<u>verdes, jardines y barrancos.</u>		abordarse los siguientes años.
P63: <u>Impulso de un Mercado Sostenible.</u>		- Las acciones realizadas se centran en los productos locales y de cercanía pero no se ha avanzado en los productos a granel y ecológicos. - No existen indicadores que permitan medir el impacto de las acciones ya que los indicadores planteados en la Agenda 2030 de Tacoronte hacen referencia al Mercadillo sostenible y se cumplimentan sobre el mercadillo del agricultor. - Se recomienda ampliar el plazo de ejecución.
P64: <u>Plan de activación y puesta en producción de tierras agrícolas.</u>		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Sin definir indicadores. - Presupuesto definido - Dado el plazo de ejecución planteado, deberá abordarse los siguientes años.
P65. <u>Programa de apoyo a jóvenes agricultores.</u>		- Buen avance en la ejecución del proyecto. - Sin definir indicadores. - Presupuesto definido - Se recomienda valorar la posibilidad de ampliar el plazo de ejecución planteado.

A12. Alumbrado público, aguas y saneamiento, apoyo familiar y prevención de las adicciones y talleres municipales

Proyecto	Estado	Situación
P09: Desarrollo de un programa de prevención y atención a las adicciones.		- Las acciones realizadas se centran exclusivamente en la prevención por lo que quedaría pendiente abordar acciones vinculadas a la información y orientación de personas afectadas por las adicciones a sustancias e incluso, servicios de tratamiento y reinserción social. Se recomienda por tanto ampliar el plazo de ejecución del proyecto. - No existen indicadores que permitan medir el impacto de las acciones que se están desarrollando.

4. SIGUIENTES PASOS.

Como resultados el análisis a partir de la información que ha podido ser recopilada mediante las fichas de cada proyecto y el estado actual de cada uno de ellos, se recomienda llevar a cabo los siguientes pasos:

- Revisión del Informe de progreso por parte de cada área municipal aportando información en el caso de que no se haya hecho con anterioridad y exista un mayor grado de ejecución.
- Incorporación de indicadores y presupuestos en las fichas de proyectos del 2025 que no posean esa información.
- Revisión de los proyectos del 2025 cuyo plazo deba ser ampliado.
- Definir el periodo de ejecución de los proyectos que actualmente no tienen fecha.
- Toma de decisiones sobre los proyectos con ejecución no prevista.
- Iniciar los proyectos del 2026.
